PLANIMETRIA CANTIERE SCALA 1:200

Legenda cantiere

M	BOX RISTORO/MENSA	ASM	AREA STOCCAGGIO MATERIALI		INTERRATO (CORDA ISOLATA DI RAME sez.≥35 mm²)
U.D.L.	BOX PER UFFICIO DI CANTIERE DIREZIONE LAVORI	SA	SERBATOIO ACQUA		FOGNATURA
U.C.C.	BOX PER UFFICIO DEL CAPO CANTIERE	IE	ISOLA ECOLOGICA		TUBAZIONE ACQUA
AL	AREA LAVORAZIONI		LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE CANTIERE	D	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
S	BOX DOCCIA/SPOGLIATOIO		RECINZIONE DI CANTIERE PANNELLO FONOASSORBENTE		POZZETTO DI SEZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (dim. 30x30cm)
I	BOX INFERMERIA		TUBAZIONE INTERRATA IN PVC FLESSIBILE SERIE PESANTE DI PROTEZIONE AI CONDUTTORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO		POZZETTO dim. 30X30 cm COMPLETO DI DISPERSIONE DISPERSIONE IN ACCIAIO RAMATO Ø18 mm H≥2500 mm

Particolare bagno chimico tipo per cantiere



Bagno mobile chimico già assemblato e pronto all'uso in polietilene atermico ad alta densità antiurto e che consente alla cabina di essere calda in inverno e fresca in estate. La cabina è dotata:
Wc chimico, orinatoio, erogatore di carta igienica, erogatore di disinfettante, contenitore disinfettante, sistema di aerazione della cabina, tetto traslucido, che filtra la luce dall'esterno.

Stralcio planimetrico - vigente pai - scala 1:20.000

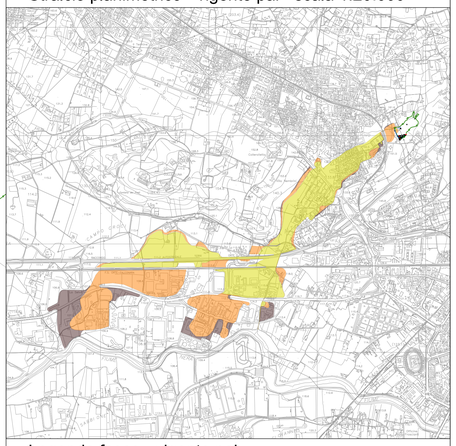

Legenda fasce - vigente pai

- Fascia A - Tr 50
- Fascia B - Tr 200
- Fascia C - Tr 500

consorzio di bonifica teverenera

"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FOSSO RIVO IN COMUNE DI TERNI, 1° STRALCIO". PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – SUB INVESTIMENTO 2.1b – MISURE PER LA GESTIONE DI RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

PROGETTO ESECUTIVO

CUP B41J22000120002 - CIG B0402F4AF5

COMMITTENTE:
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERENERA
UFFICIO:
COMUNE DI TERNI

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO - R.U.P.:
ing. Barbara Leli

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Regione Umbria
Giunta Regionale

PROGETTAZIONE: OPERA S.C.A.L. - Consorziata esecutrice ABACUS SRL
OPERA
ABACUS
Via Campo di Marte, n. 6/a
06124 - Perugia (PG)
www.abacusprogetti.it - 075/5058180

LAVORI: TROVATI SRL
TROVATI
Strada Provinciale, 211/C
06133 - Perugia
www.trovatisrl.it - 075/774262

PROGETTISTI	
Responsabile integrazione prestazioni specialistiche	ing. M. Serafini
Architettura ed urbanistica	arch. Ing. C. Pimpinelli
Opere strutturali	ing. E. Podrini - ing. Giampaolo Giacobbi
Idrologia e opere idrauliche	ing. S. Barretta
Progettazione geotecnica	ing. G. Fanelli
Paesaggio ed ambiente	ing. A. Milito
Responsabile sicurezza	ing. M. Serafini
Computi e capitolati	geom. S. Pilleri
Cantierizzazione e C.S.P.	ing. M. Serafini - ing. F. Tagliente
Building Information Modeling	ing. L. Serafini - arch. Rezkinallah Fetnaj

TIMBRI

CARTELLA C0 - CANTIERI E SICUREZZA

LAYOUT DI CANTIERE

C0_DFC01

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	4	2	2	E	C0	D	FC	01	00	2422_E_C0_DFC01_00	1:200

REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Giugno 2024	F.Tagliente	S.Barretta	M.Serafini		Consegna Progetto Esecutivo
1						
2						
3						

la riproduzione del presente disegno è vietata a termini di legge senza la espressa preventiva autorizzazione
